


Notulen van de 1e bouwvergadering, betreffende de restauratie van de molen de Specht te Noordhorn, gehouden op 22 september 1982.



Aanwezig de heren:

Heijdra van Monumentenzorg;
van Slochteren van de Molencommissie;
Dunning, aannemer;
Koopman, Kapinga en Tuinstra namens de gemeente Zuidhorn.

Fortuna

De heer Kapinga opent de vergadering en heet een ieder welkom.

Opdracht.

De aannemer heeft de opdracht ontvangen en is inmiddels met de werkzaamheden gestart. Als streefdatum van oplevering wordt 1 oktober 1983 gesteld. De eerste kwartaalformulieren dienen voor 15 oktober a.s. ingediend te zijn i.v.m. verfijningsregeling.

Molenaar op molen.

Bij de molencommissie zijn voorbeeldcontracten verkrijgbaar, welke van toepassing zijn op de vrijwillige molenaars.

Begroting.

Deze is zo langzamerhand door de diverse aanvullingen onoverzichtelijk geworden. Door de dienst gemeentewerken zal een nieuwe overzicht worden gemaakt.

U.A.V.

Deze is van toepassing op alle opgedragen werkzaamheden (dus ook op meerderwerk).

Uurloon.

De aannemer stelt een uurloon voor van f 38,- gedurende de tijdsduur van het werk. Zowel door Monumentenzorg als door gemeentewerken zal op korte termijn nagegaan worden of dit akkoord is.

f 36.20

Kraanwerk.

De aannemer merkt op dat de nieuwe bewoner van het pand Langestraat 14 de tuin zodanig heeft aangelegd dat er niet meer met een kraan gewerkt kan worden. Dienst gemeentewerken zal overleg plegen over tijdelijk weghalen van afrastering en planten.

Meerderwerk.

De aannemer deelt mede dat reeds diverse dingen zijn ontdekt, welke niet zijn opgenomen. Dit zal na afloop van de vergadering ter plekke worden bekeken. Verder zal voor meerderwerk of uit te voeren stelposten door gemeentewerken een opdrachtbon aan de aannemer worden verstrekt, alvorens met deze werkzaamheden wordt aangevangen.

Volgende vergadering.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 13 oktober 1982 om 16.00 uur bij de molen.

16.00 uur 16.00 uur

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Zuidhorn, 24 september 1982.

Notulen van de 2e bouwvergadering, betreffende de restauratie van de molen de Specht te Noordhorn, gehouden op 13 oktober 1982.

40
13/10
140

Aanwezig de heren:
Heijdra - Monumentenzorg,
Pasveer - Molencommissie,
Koopman, Kapinga en Tuinstra - gemeente,
Dunning - aannemer.

Fortuna

De heer Kapinga opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Molenaar op molen.

Unaniem is men van mening dat de heer Bakker de molen voorlopig moet blijven draaien, zolang zijn gezondheid dit toelaat. Wel zal ter assistentie een "leerling" door hem moeten worden ingewerkt, e.e.a. in samenspraak met de Gron. Molencommissie, welke in de toekomst het werk van hem kan overnemen.

Molenaar →
vr.

Uurloon.

Het tijdens de vorige vergadering voorgestelde uurloon van f 38,- wordt door Monumentenzorg niet geaccepteerd. Aannemer moet een gespecificeerd opgebouwd uurloon indienen of akkoord gaan met het maximum uurloon waar Monumentenzorg mee akkoord gaat, zijnde f 36,20. Na enige discussie gaat aannemer akkoord met uurloon van f 36,20 gedurende de tijdsduur van het werk.

Meerderwerk.

Aan het begin van de vergadering is ter plekke het volgende als meerderwerk opgenomen:

1. keerstijl met korbeel vernieuwen.
2. halslagerblok vernieuwen.
3. steenbord vernieuwen in aluminium.

Na de vorige vergadering is ter plekke het volgende meerderwerk opgenomen:

1. nieuwe windpeluw van bielenga.
2. korte spruit + opbouw vervangen.
3. kuip doorspijkeren.
4. voor- en achter aanlopers vernieuwen.
5. aanbrengen nieuwe burgemeester.
6. naar binnen brengen voeghouten.
7. schegstuk op voeghout.

Verder is opdracht gegeven tot uitvoering van de volgende stelposten:

1. laseind aan voeghout.
2. + 5,50 m. spantring vernieuwen.
3. lange spruit afdekken met loderite.

Opdrachten.

Besloten wordt dat voor alle meerderwerk en stelposten boven f 1000,- van gemeentewege een opdrachtbon aan de aannemer zal worden verstrekt.

Vordering van het werk.

Gevraagd wordt wanneer de kap weer dicht is. Aannemer moet nog diverse werkzaamheden verrichten, alvorens het kaphout wordt aangebracht. Verwacht wordt dat de kap over 14 dagen dicht is.

Volgende vergadering.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 16 november 1982, om 16.00 uur bij de molen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Zuidhorn, 19 oktober 1982.

(140) 16/12
B 49

Notulen van de 3e bouwvergadering, betreffende de restauratie van de molen de Specht te Noordhorn, gehouden op 16-11-1982.

=====

Aanwezig de heren:

- Fortuna*
- Heydra - Monumentenzorg,
 - Van Slochteren en Pasveer - Molencommissie,
 - Koopman, Kapinga en Tuinstra - gemeente.

Afwezig zonder kennisgeving de heer:

- Dunning - aannemer.

De heer Kapinga opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Technische omschrijving.

Deze week zal een nieuwe technische omschrijving worden gemaakt door de dienst gemeentewerken. De heer Koopman vraagt of het mogelijk is dat hij een beter financieel overzicht krijgt dan hij thans heeft, gemeentewerken zal alle gegevens doorgeven.

Ondertafelement.

Besloten wordt geen ondertafelement aan te brengen onder de achtkantstijlen, mocht aan het einde van de restauratie blijken dat er financieel nog wat ruimte is, dan zal alsnog een verbinding tussen de achtkantstijlen worden gemaakt d.m.v. een ijzeren staaf.

Uittimmermandjes.

Ter plaatse wordt gekonstateerd dat deze moeten worden vervangen. Tevens wordt het type stellingdeuren vastgesteld, namelijk raampjes ter grootte van die welke in de deuren aan de oostkant zitten, voorzien van een ruitje in de vorm van een zgn. "wybertje".

Achtkant.

I.v.m. het jaargetijde is het niet verantwoord meer dan 1 veld open te leggen. Aannemer heeft hiervoor een oplossing, namelijk 1 veld openhalen en de twee aangrenzende velden langs de achtkantstijl door te zagen. Hiermee kan een ieder zich verenigen.

Rondvraag.

I.v.m. het steeds terugkerende noodzakelijke meerderwerk stelt de heer van Slochteren voor om niet essentiële dingen, welke wel zijn opgenomen en geraamd, in eerste instantie niet uit te voeren en op deze manier een soort reserve-pot te kweken.

Unaniem is men van mening dat dit voorstel door moet gaan.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 22 december 1982, om 9.00 uur bij de molen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Zuidhorn, 2 december 1982.

140
10/1
50

Notulen van de 4e bouwvergadering, betreffende de restauratie van de molen "de Specht" te Noordhorn, gehouden op 22-12-1982.

=====

Aanwezig de heren:

Heydra namens Monumentenzorg;
van Slochteren en Pasveer namens de Molencommissie;
Koopman, Kapinga en Tuinstra namens de gemeente;
Dunning als aannemer.

De heer Kapinga opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

Technische omschrijving.

Hierin staan enige onjuistheden, namelijk de volgende punten:

2.g. kapplanken 1,6 x 29 moet zijn 1,6 x 20.

3c, 3h, 3k en 3n.: "grenenhout" moet zijn "lariks".

3j.: duims kleedhout moet zijn 19 mm.

Zonder nader overleg is verder valéron i.p.v. ventifol toegepast, ondanks dat de dampdoorlatendheid van dit materiaal niet groot is, is men toch van mening dat dit produkt kan worden toegepast. Met name de sterkte van het materiaal heeft bewezen een storm goed te kunnen doorstaan.

Meerderwerk.

Het ter plekke gekonstateerde meerderwerk (bandstuk en latei) zal nog niet worden uitgevoerd. Getracht zal worden om dit uit te laten voeren uit de post jaarlijks onderhoud.

Uit de technische omschrijving blijkt dat er eigenlijk geen posten zijn die "niet essentieel" zijn en derhalve niet direct uitgevoerd behoeven te worden, zodat het "kweken van een reservepot", zoals tijdens de vorige vergadering was afgesproken, niet meevalt.

Stelpost sloopwerkzaamheden.

Volgens de aannemer zou dit o.a. zijn voor het slopen van de bestaande achtkantbekleding en verwijderen van zolders die vernieuwd moeten worden.

Zowel Monumentenzorg als de gemeente kunnen zich hiermee niet verenigen, te meer daar in de begroting van de aannemer "het verwijderen van het kleedhout" ook al genoemd/gerekend wordt.

Besloten wordt dat deze post niet mag worden opgevoerd, behalve dan voor het afvoeren van sloophout c.a. middels een container.

Rondvraag.

De nieuw aangebrachte hoekaanlopers en veldregels zijn erg licht van constructie. Door de aannemer wordt toegezegd dat deze zullen worden verzwaard.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 16 februari 1983 om 9.00 uur bij de molen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Zuidhorn, 5 januari 1983.

51
19/5

=====
Aanwezig de heren:
Heydra van Monumentenzorg,
Pasveer van de Molencommissie,
Kapinga en Tuinstra van de gemeente,
Dunning als aannemer.

De heer Kapinga opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voortgang werk.

Aan de hand van de planning blijkt dat het werk op schema ligt, verwacht wordt dat het werk sept./okt. gereed is.

Vorm van toegangsdeuren.

De aannemer wil graag de nieuwe toegangsdeuren maken i.v.m. het afsluiten van de molen. De vraag is of deze aan de bovenzijde rond moeten worden gemaakt of recht, zoals bestaande situatie. Gelet op het kostenaspect wordt besloten, afhankelijk van de werkelijke kosten metselwerk c.a. op de volgende vergadering de vormgeving vast te stellen.

Metsel- en voegwerk.

Dienst gemeentewerken zal zorgen voor prijsopgaven voor het herstellen van het metsel- en voegwerk. Eveneens zal dan een prijs gevraagd worden voor het metselen van een boog boven de toegangsdeuren.


Gietijzeren ramen.

Door de aannemer zal een raam worden verwijderd, waarna de heer Heydra dit mee zal nemen naar de Keppelse IJzergieterij te Laag-Keppel, waarna 4 stuks nieuwe ramen zullen worden gegoten.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 31 mei 1983 om 10.30 uur bij de molen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Zuidhorn, mei 1983.

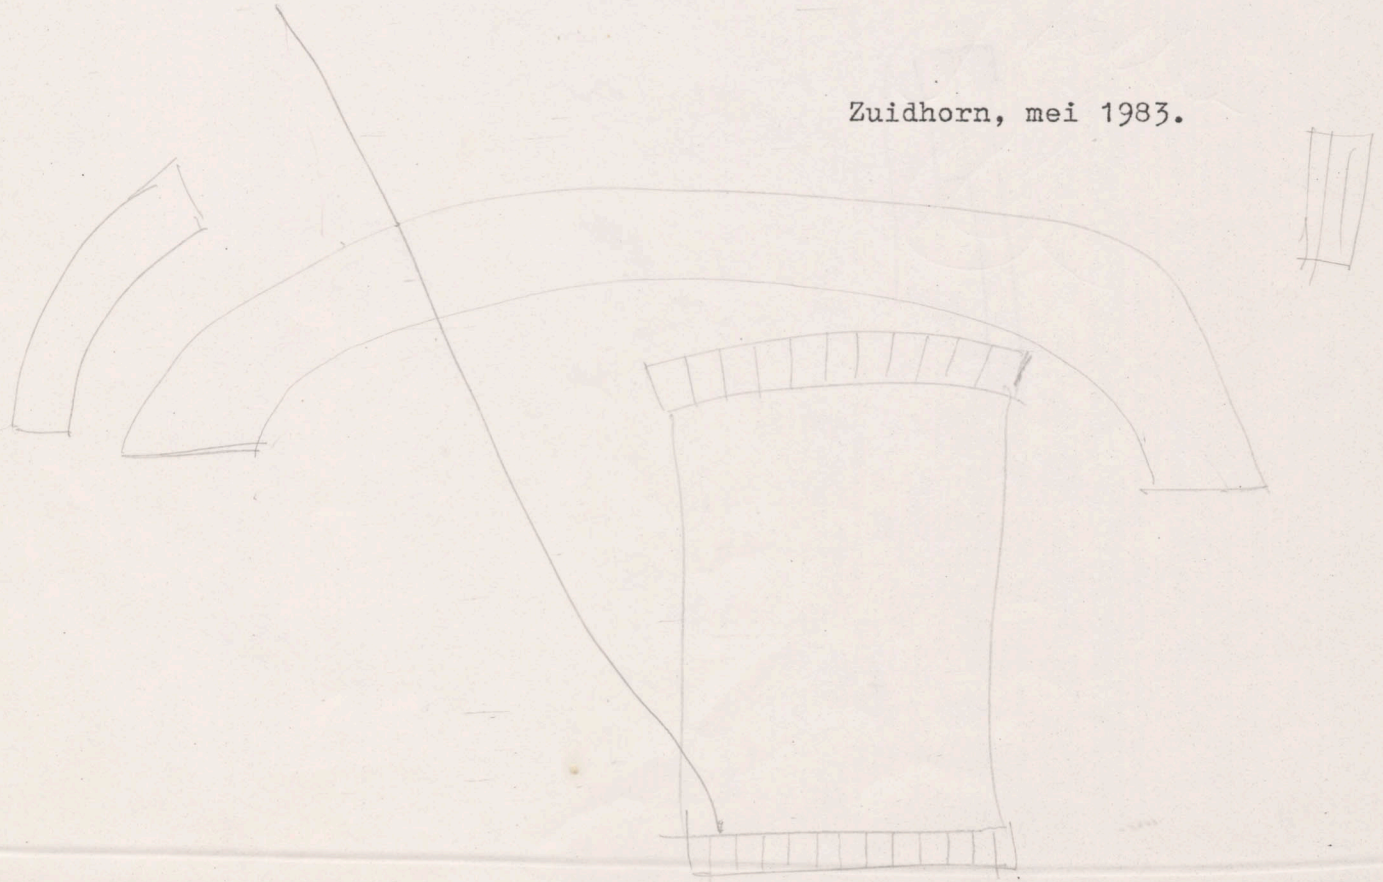

Notulen van de 6e bouwvergadering, betreffende de restauratie
van de molen "De Specht" te Noordhorn, gehouden op 31-5-1983.

=====

Aanwezig de heren:

Heydra	- Monumentenzorg
van Slochteren	- Molencommissie
Kapinga/Tuinstra	- gemeente
Dunning/Westers	- aannemer.

De heer Kapinga opent het overleg en heet iedereen welkom.

Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

Toegangsdeuren.

Besloten wordt om de deuren van boven een ronde vorm te geven, en het metselwerk aan te passen d.m.v. een boog (ellipsboog)
Tevens zal de grondslag t.p.v. de toegangsdeuren dusdanig verlaagd worden dat de oorspronkelijke draaipunten weer gebruikt kunnen worden.
De aannemer dient met het maken van de deuren hiermee rekening te houden.

Gietijzeren ramen.

I.p.v. vier moeten er vijf stuks vernieuwd worden, het raam boven de toegangsdeuren blijft gehandhaafd in hout.

Remkleppen.

Door de aannemer wordt voorgesteld om de remkleppen te laten vervallen, hierdoor ontstaat minder werk, waarmee het wat wordt gecompenseerd.
Na ampele overwegingen wordt dit voorstel aangenomen, met dien verstande dat de molen wel wordt voorzien van zeilen.
Eventueel tekort komende kikkers worden door Monumentenzorg beschikbaar gesteld. Voor het draaien van de molen door vrijwilligers heeft e.e.a. geen konsekventies.

Meerderwerk.

Door de aannemer zal prijsopgave worden gedaan van de volgende posten:
vernieuwen meelwring rond maalsteen en aanbrengen kroonlijst.

Rondvraag.

De aannemer deelt mede dat er momenteel extra mensen met de molen bezig zijn, dit houdt verband met het feit dat zij over één à twee weken met alle manschappen naar de molen van Usquert moeten.
Mits de eerder vastgelegde opleveringsdatum geen gevaar loopt kan een ieder zich hiermee verenigen.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 29 juni 1983, om 10.30 uur bij de molen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Zuidhorn, 16 juni 1983.

Notulen van de 7e bouwvergadering betreffende de restauratie van de molen de specht te Noordhorn, gehouden op 29-6-1983.

Aanwezig de heren: Heydra - monumentenzorg.
van Slochteren/Pasveer - molenkommissie.
Kapinga/Tuinstra - gemeente.
Dunning/Westers - aannemer.

De heer Kapinga opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

Metselwerk:

voor het herstellen van het metsel- en voegwerk, incl. het metselen van een boog boven de toegangsdeuren is nog steeds geen prijs binnen.
Gemeentewerken zal de nodige druk uitoefenen om deze prijs op korte termijn te krijgen.

Gietijzeren ramen:

de fabrikant van de gietijzeren ramen blijkt intussen failliet te zijn. Er is reeds contact geweest met een andere gieterij, welke bereid is de ramen te gieten voor dezelfde prijs.
Verder beschikt de Ferwerder Molenstichting over een tuimelraam van dezelfde afmeting. Getracht zal worden dit raam over te nemen en dan vier i.p.v. vijf te laten maken bij de gieterij.

De staart:

nu de nieuwe stelling weer waterpas is aangebracht blijkt dat de staart omhoog moet. Konsekwentie hiervan kan zijn dat de lierketting te kort is omdat de pennen op de stelling 10 à 15 cm. achteruit komen.
Besloten wordt om de zaak eerst nader te bekijken en zonodig de ketting te verlengen.

Rondvraag:


de aannemer stelt voor om onder de laatste drie stellingsplanken tegen de molen schegstukken aan te brengen en dan deze af te dekken met masonite en vawador ter bescherming van het onderliggend metselwerk.
Omdat dit meerderwerk is wordt besloten in eerste instantie alleen de schegstukken aan te brengen en de bliksembeveiliging omhoog te brengen.
Eventueel zal dan volgend jaar uit de post onderhoud masonite en vawador kunnen worden aangebracht.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 7 september 1983 om 8.30 uur bij de molen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

28 september 8³⁰ bouwvergadering

Notulen van de 8e bouwvergadering, betreffende de restauratie van de molen de Specht te Noordhorn, gehouden op 7 sept. 1983.



Aanwezig de heren:

Heydra namens Monumentenzorg,
van Slochteren namens de Molencommissie,
Koopman, Kapinga, Dijk en Tuinstra namens de gemeente,
Dunning en Westers namens de aannemer.

De heer Kapinga opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

✓ Grondslag bij deuren.

De gemeente zal zorgen dat op korte termijn de grond voor de toegangsdeuren zal worden weggehaald, zodat de nieuwe deuren kunnen worden aangebracht.

✓ Gietijzeren ramen.

Waarschijnlijk zullen deze binnen 14 dagen op het werk aanwezig zijn.

✓ Lierketting.

Het blijkt dat, zoals reeds in de vorige vergadering is gesuggereerd, de lierketting inderdaad 1 à 1½ m. te kort is. Aannemer zal deze verlengen.

✓ Slot op molen.

De nieuwe deuren zullen worden voorzien van een Keso-slot. Gemeente zal zorgen dat een dergelijk slot wordt besteld. I.v.m. de lange levertijd zal de gemeente tijdelijk een ander slot beschikbaar stellen.

✓ Bliksembeveiliging.

De gemeente zal contact opnemen met de installateur om de beveiliging omhoog te brengen i.v.m. het aanbrengen van Vawador tegen het achtka-

✓ Roeden.

Tijdens het doorhalen van de roede is gebleken dat van één van de roeden de wanddikte maar 5 mm. i.p.v. 8 mm. is. Geadviseerd wordt deze in de gaten te houden. Roeden zullen worden gekoolteerd.

✓ Financiën c.a.

Na opstellen financieel overzicht zal een beslissing over de remklep, metselwerk enz. worden genomen (op korte termijn).

hoop het met de 28 sept. d.o.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 28 sept. 1983, om 8.30 u bij de molen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

4 stuks 20 liter 1650.- per stuk zal financieel worden betaald.

Zuidhorn, 20 september 1983.

1 nov. gereed.

Aanwezig de heren: Heydra van Monumentenzorg,
Pasveer van de Molencommissie,
Koopman, Kapinga en Tuinstra van de gemeente,
Dunning en Westers namens de aannemer.

De heer Kapinga opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

Meerderwerk.

Het blijkt dat, nu de achtkant rechtgezet is, het bovenwiel naar voren moet. In de begroting is hierop niet gerekend, de aannemer zal de kosten opvoeren als zijnde meerderwerk, met dien verstande dat de kosten maximaal 32 manuren zullen bedragen.

Achtkant.

Het achtkant vertoont vrij veel witte verfspatten, veroorzaakt door het verfwerk van de staart. In tegenstelling van eerder genomen besluiten wordt alsnog voorgesteld om het achtkant te teren, om op die manier de witte spetten weg te werken. De aannemer stelt voor de werkzaamheden uit te voeren op fifty-fifty basis, te weten 50 % van de kosten voor rekening opdrachtgever en 50 % voor rekening van de aannemer. Hiermee kan een ieder zich verenigen, besloten wordt het achtkant alsnog te teren.

Prijsopgave remkleppen e.d.

Door de aannemer zijn de volgende prijsopgaven gedaan:

- maken en leveren nieuwe meelring f 986,-. excl. BTW
- maken en leveren van een nieuwe kroonlijst - 2000,-. excl. BTW
- maken en leveren van een nieuwe fokwiek Faußl met
remklep op één roede, welke regelbaar is bij de
staart door handbediening - 9550,-. excl. BTW

Bovengenoemde werkzaamheden zijn reeds opgedragen en uitgevoerd.

Gietijzeren ramen.

Gemeente zorgt voor beglazing (plexiglas).

Vooroplevering: 1 december 1983 om 9.00 uur bij de molen.

Oplevering: 7 december 1983 om 9.00 uur bij de molen.

Feestelijke ingebruiknemning: in nader overleg met de Vereniging Dorpsbelangen te Noordhorn.

N.B.: Tijdstip feestelijke ingebruiknemning is vastgesteld op 10 december 1983 om 14.00 uur.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Zuidhorn, 17 november 1983.

=====

Aanwezig de heren:

Heydra	- Monumentenzorg.
van Slochteren en Pasveer	- Molencommissie.
Koopman, Tuinstra en Kapinga	- Gemeente
Dunning en Westers	- Aannemer
Graeler	- Vrijwillig molenaar.

De heer Koopman opent de vergadering en heet allen welkom.

Uitvoering restauraties.

Door de voorzitter wordt gesteld dat de restauratie naar volle tevredenheid is uitgevoerd, unaniem is men het hier mee eens.

Oplevering.

Gekonstateerd is dat de volgende werkzaamheden nog door de gemeente moeten worden verricht:

- a. spijkerplaat aanbrengen op spant in kap.
- b. roostervloer voorzien van opgeklampte delen en luiken.
- c. het nieuw aangebrachte stuk in de glijring aan de achterzijde dusdanig opvullen dat ronding gelijk wordt.
- d. stormhaken stellingdeuren aan muur i.p.v. aan deuren.

Lijst van Molencommissie Noordhorn.

- 1.1. Zowel Monumentenzorg als de Gron. Molencommissie zijn van mening dat een spanband met keerneuten niet nodig zijn. Het betreft hier namelijk een doorgespijkerde eiken keerkuij, welke in goede staat verkeert, en in het verleden heeft bewezen de kap wel op zijn plaats te kunnen houden. Van groot belang is hier het smeren van neuten en kuuip, immers hoe lichter het kruien hoe minder de krachten op de kuuip.
- 1.2. Op dit moment nog geen probleem, de bonkelaar is vrij zwaar uitgevoerd, ged. eventuele vervanging in de toekomst zal uit de onderhoudspost moeten worden uitgevoerd.
- 1.3. Gemeentewerken zal zorgen dat strook vawador op stelling wordt aangebracht.
- 1.4. Zeilen van één roede zijn reeds aanwezig, de aannemer zal prijsopgaaf doen voor het aanbrengen van kikkers, zeilarmen, zeilogen en klampen op één roede.
- 1.5. tem. 1.7. Zal door de te vormen beheerscommissie nader worden bestudeerd en zo nodig worden uitgevoerd.
- 2.1. Zal door beheerscommissie nader worden bestudeerd en zal door gemeentewerken tijdens onwerkbaar weer worden aangebracht.
- 2.2. Reeds door molenaar aangebracht.
- 2.3. Plaatsing 2 brandblussers akkoord, 3 stuks gewenst.
- 2.4. Aanschaf verbandtrommeltje akkoord.
- 2.5. Veiligheidslijn wordt door molencommissie verzorgd.
- 2.6. Zal in beheerscommissie worden besproken.
- 2.7. Gemeentewerken zal een 8-tal wiggen leveren voor het afsluiten van de stellingdeuren.
- 2.8. Besloten wordt twee bordjes te plaatsen, teweten "verboden voor onbevoegden" onder in de molen en "betreden op eigen risico" op de 1e verdieping.
- 2.9. Zal door de beheerscommissie nader worden bestudeerd, eventueel kan aanleg gebeuren door leden van de commissie.
- 2.10. In beheerscommissie bespreken, eventueel oplossen.
- 2.11 en 2.12. Reeds uitgevoerd.
- 3.1. tem. 3.8. Zal door de beheerscommissie nader worden bestudeerd en zonodig worden uitgevoerd/aangeschaft.
- 4.1. Door de gemeente ingediend in het kader van werkverruimende maatregelen.

- 4.2. tem. 4.6. Betreffen wensen, welke door de beheerscommissie zullen worden getoetst in hoeverre deze noodzakelijk zijn.

Aanvullende lijst.

1. Vensterbanken zijn van dusdanige houtsoort (bielinga), dat verrotting praktisch onmogelijk is.
2. Constructie van de ramen is dusdanig dat deze uitneembaar moeten zijn, dit betekent dat er altijd wel een beetje water onderdoor kan gaan, verontrustend is dit niet. Wel zullen de vaste gietijzeren ramen in het metselwerk worden nagelopen op eventuele lekkages.
3. De vangketting is door Monumentenzorg en Gron. Molencommissie bekeken tijdens de restauratie. Geadviseerd is toen om de ketting om te draaien, hetgeen is gebeurd. Momenteel is de ketting nog in vrij goede staat, ketting zal echter in de gaten gehouden worden door beheerscommissie en wordt vervangen zodra dit mogelijk is.
- 4 en 5. Deze punten zijn reeds eerder genoemd en zal door de molenmaker worden hersteld.
6. Volgens monumentenzorg en gron. molencommissie functioneert de ezel goed en is wel instelbaar, reden tot vervanging is niet aanwezig.
7. In het verleden is een beschadiging opgetreden aan de steen (waarschijnlijk stukje ijzer, schroef of i.d.), dit moet zichzelf herstellen door veel gebruik. Volgens gegevens van molenaar Bakker kan de looper van het andere koppel niet gebruikt worden daar deze gescheurd is. Bedoeling is echter ook niet dat er concumtiemeel wordt geproduceerd, diervoeder is ruim voldoende.
8. Beheerscommissie zal dit nader bestuderen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Zuidhorn, 1-2-1984.
