

GEMEENTE



ADORP

Verslag van de 1e bouwvergadering restauratie Wetsinger molen

Aanwezig : de heren D. Kruijer, J. Heijdra, S. Pasveer, K. Doornbosch, A. Doornbosch en J.H. Koop.

Afwezig : de heer E. Offeringa (met kennisgeving).

Onderwerp:	Aktie door :																		
<p>De heer D. Kruijer opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij stelt voor, dat hij in het vervolg de vergaderingen zal voorzitten en dat het secretariaat door de heer Koop zal worden verzorgd.</p> <p>De heer Koop geeft een overzicht van alle toegezegde subsidies m.b.t. de restauratie t.w.:</p> <table border="0"> <tr> <td>- Monumentenzorg</td> <td>f</td> <td>135.000,--</td> </tr> <tr> <td>- Provincie</td> <td>"</td> <td>60.000,--</td> </tr> <tr> <td>- Gemeente</td> <td>"</td> <td>70.000,--</td> </tr> <tr> <td>- Eigenaarsaandeel</td> <td>"</td> <td>35.000,--</td> </tr> <tr> <td>- BTW-aftrek</td> <td>"</td> <td>57.000,--</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>f</td> <td>357.000,--</td> </tr> </table> <p>De heer K. Doornbosch deelt mee, dat nog geen schriftelijke opdracht m.b.t. de restauratie is ontvangen.</p> <p>Overigens is al wel begonnen met het herstellen van de diverse materialen.</p> <p>Afgesproken wordt dat de materiaalkeuring verricht zal worden door de heren Heijdra en Pasveer. M.b.t. dit projekt is het niet noodzakelijk z.g. weekstaten in te vullen.</p> <p>De heer Heijdra zal de kleurmogelijkheden t.b.v. de achtkant nagaan.</p> <p>De volgende vergadering zal worden gehouden op woensdag 2 april 1986, 16.00 uur bij de molen te Wetsinge.</p> <p><i>Volgende vergadering 23 april. Doornbosch hout zoeken</i></p> <p><i>Red Wood / Red Cedar.</i></p>	- Monumentenzorg	f	135.000,--	- Provincie	"	60.000,--	- Gemeente	"	70.000,--	- Eigenaarsaandeel	"	35.000,--	- BTW-aftrek	"	57.000,--	Totaal	f	357.000,--	<p>Offeringa</p> <p>Heijdra</p>
- Monumentenzorg	f	135.000,--																	
- Provincie	"	60.000,--																	
- Gemeente	"	70.000,--																	
- Eigenaarsaandeel	"	35.000,--																	
- BTW-aftrek	"	57.000,--																	
Totaal	f	357.000,--																	



GEMEENTE

ADORP

14/4 23
P/S

Verslag van de 2e bouwvergadering restauratie Wetsinger molen

Aanwezig : de heren D. Kruijer, A. Doornbosch, J. Pasveer, J. Heijdra en J.H. Koop.

Afwezig: de heer E. Offringa (met kennisgeving)

Onderwerp:

Aktie door :

- ✓1 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
- ✓2 Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
- ✓3 M.b.t. het metselwerk van de onderbouw wordt afgesproken dat de fa. Teeninga te Sauwerd schriftelijk met voorstel van behandeling, voorzien van een prijskaartje, zal indienen bij de fa. Doornbosch. Zo mogelijk zal in het metselwerk oude bouwkundige elementen worden aangegeven.
- ✓4 Gunning van het werk: Uit gesprekken van de burgemeester en de eigenaar is naar voren gekomen, dat de gunning z.s.m. schriftelijk zal worden bevestigd.
- ✓5 Termijnen zullen bij de bouwcommissie worden ingediend. Na akkoord bevinding door de commissie, zullen ze ter betaling worden doorgezonden aan de eigenaar.
- ✓6 De kap zal worden uitgevoerd in z.g. Potdekselwerk.
- 7 M.b.t. de aan te brengen verfkleur, zal door een ieder denkwerk worden verricht.
- ✓8 Monster van te verwerken materiaal zal worden meegenomen. *Hekwerk Taffin bar-linar. Kleppen Beel Wood*
- ✓9 De voorzitter stelt voor, na afloop van de restauratie bv 2 maal per jaar controle te plegen op mogelijke gebreken e.d.
- 10 De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 23 april 1986 's middags te 16.00 uur bij de molen te Wetsinge.

16.00 uur 14 mei

volgende vergadering

*Aktie Koop.
Eigenaar moet nog tekenen.*

Doornbosch



GEMEENTE

ADORP

B/12/544

Verslag van de 3e bouwvergadering restauratie molen te Wetsinge

Aanwezig : de heren D. Kruijer, A. Doornbosch, K. Doornbosch,
J. Heijdra, J.H. Koop en J. Pasveer.

Afwezig: de heer E. Offeringa

Onderwerp:	Aktie door :
1. Verslag van de 2e bouwvergadering wordt voor kennisgeving aangenomen. 2. Van de fa. Teeninga te Sauwerd is een voorstel ontvangen m.b.t. het behandelen van de pleisterlaag, echter zonder het daarbij behorende "prijkskaartje". Voor de volgende vergadering moet deze echter wel binnen zijn. Het behandelingsvoorstel ontmoet in principe geen bezwaren.	Doornbosch
3. Kennis genomen wordt van de definitieve toezegging van de provincie Groningen om een subsidie van f 60.000,-- in de restauratiekosten toe te kennen. Eveneens wordt van een toezegging van het J.B. Scholtensfonds f 4.000,-- , bij te dragen in de restauratiekosten, kennis genomen. M.b.t. de uitbetaling van het provinciaal subsidie zal contact worden opgenomen met de heer Stuiver van de provinciale griffie. Ook zal bij de Hollandsche Molen informaties worden ingewonnen over eventuele voorfinanciering van het rijkssubsidie.	Koop
4. Over de kleur van de molen is nog geen keuze gemaakt. 5. Als materiaal voor het maken van de heklatten wordt gekozen voor "Bangkirai", idem voor de kleppen: "Redwood".	Doornbosch
6. Vrijdag 25 april 1986 zal onderzoek worden gedaan naar de toestand van de stijlen van het achtkant. 7. De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 14 mei 1986, 's middags om 16.00 uur bij de molen te Wetsinge.	Heijdra/ Pasveer
<p>2 stijlen goed 2 " schegde laken 4 " vernieuwen</p>	



GEMEENTE

ADORP

Verslag van de 4e bouwvergadering restauratie korenmolen te Wetsinge dd. 14 mei 1986

Aanwezig : de heren D. Kruijer, A. Doornbosch, K. Doornbosch, J.H. Koop, J. Heijdra en S. Pasveer.


Afwezig: de heer E. Offringa

Onderwerp:

Aktie door :

- ✓ 1. Verslag van de 3e bouwvergadering wordt goedgekeurd.
- ✓ 2. Naar aanleiding van het verslag van de 3e bouwvergadering wordt meegedeeld, dat de provincie Groningen bereid is, desgevraagd, tussentijds het subsidie uit te betalen. Van de kant van de Hollandsche Molen is nog geen positieve reactie ontvangen.
- ✓ 3. Over de kleur van de molen wordt verder nagedacht.
- 4. Van de fa. Teeninga te Sauwerd is een offerte ontvangen m.b.t. het herstel van het pleisterwerk aan de binnen- en buitenkant van de molen. In deze offerte staan twee mogelijkheden aangegeven, n.l.
 - a. methode Remmers f 7.556,50
 - b. traditionele methode " 4.581,50
 In principe geniet de tweede methode de voorkeur. Over de hierin nog zittende onduidelijkheid (al of niet incl. verfwerk) zal nog worden geïnformeerd. *Doornbosch.*
- 5. Nu de buitenkant van de achtkant vrij is gekomen blijkt dat 4 stijlen vervangen moeten (*E. ku*) worden. In de begroting is rekening gehouden met:
 - aanlassen van 3 stijlen
 - 2 scheggen
 Daarnaast is ook de kwaliteit van de meeste kruisen erg slecht.

Doornbosch

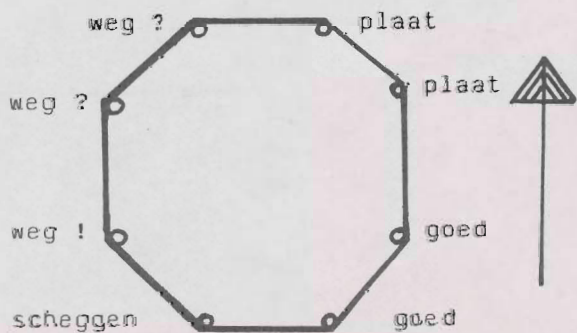

MOLENSTREEK

Door de fa. Doornbosch wordt een en ander berekend op f 33.492,-- excl. BTW en f 39.845,-- incl. BTW. Omdat hiervoor nog geen dekking aanwezig is, wordt besloten de restauratie voorlopig stil te leggen, tot meer zicht is op een bijdrage van De Hollansche Molen.

Gemeente

Op een desbetreffende vraag antwoordt de heer

A. Doornbosch dat dit het laatste meerwerk is.

heeft betrekking op uitstaand bed o/b/hand.

6. De volgende vergadering wordt vastgesteld op 25 juni 1986, aanvang 16.00 uur in het gemeentehuis.



GEMEENTE

ADORP

Verslag van de 5e bouwvergadering dd. 25 juni 1986 van de restauratie van de korenmolen te Wetsinge.

Aanwezig : de heren D. Kruijer, A. Doornbosch, K. Doornbosch, J. Heijdra, S. Pasveer en J.H. Koop.

Afwezig: de heer E. Offeringa

Onderwerp:

Aktie door :

1. Het verslag van de 4e bouwvergadering wordt goedgekeurd.
2. Naar aanleiding van de opmerking m.b.t. het meerwerk in het verslag van de 4e bouwvergadering wordt van de kant van de fa. Doornbosch opgemerkt, dat hier alleen bedoeld is dat er zich geen meerwerk aan de achtkant zal voordoen. De heer Kruijer merkt op dat hij de opmerking tijdens de 4e bouwvergadering toch anders heeft verstaan en wel in die zin dat er bij de totale restauratie geen meerwerk meer zal optreden. De heer A. Doornbosch zegt nog dat dit toch niet bedoeld was, maar dat hij overigens niet verwacht dat er veel meerwerk zal optreden.

3. De heer Kruijer geeft de mogelijkheid weer om het tekort, ontstaan door het meerwerk aan de achtkant, te dekken.

- meerwerk (excl. BTW)	f	33.492,--
- dekking:		=====
* onvoorzien	f	10.300,--
* H.S. Kammingafonds	"	4.000,--
* Pr. Bernhardfonds	"	15.000,--
* Stelpost meerwerk	"	5.000,--
	f	34.300,--
		=====

Zijn conclusie is dan ook, dat het werk weer opgestart kan worden. Overigens is volgens hem alle rek er nu ook volledig uit. Nieuw meerwerk kunnen we ons niet veroorloven. Iedereen stemt met deze conclusie in. Als materiaal voor de nieuwe stijlen wordt gekozen voor "eiken". T.a.v. planning wordt i.v.m. levering van materiaal, bouwvakvakantie, besloten, dat de eerste week

van september weer met het werk zal worden
begonnen.

Doornbosch

- 4. M.b.t. de stelpost "stukadoorwerk" en de
daarvoor door de fa. Teeninga uitgebrachte
offerte, wordt nog opgemerkt, dat nog
niet bekend is of het verfwerk nu wel of
niet in de raming is begrepen. *→ excl. s.c.f.w.e.l.*
Hierover zal nog navraag worden gedaan.

Doornbosch

- 5. Volgende bijeenkomst is op woensdag
3 september 1986 16.00 uur in het ge-
meentehuis te Sauwerd.

*Voor de winter acht leunstoelen
plaatsen en waterdicht maken.*



GEMEENTE

ADORP

Verslag van de 6e bouwvergadering dd. 3 september 1986 van de restauratie van de korenmolen te Wetsinge.

Aanwezig : de heren J.H. Koop, K. Doornbosch, J. Heydra en S. Pasveer.

Afwezig: de heren D. Kruijer, A. Doornbosch en E. Offeringa.

Onderwerp:

Aktie door :

1. Het verslag van de 5e bouwvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Naar aanleiding van dit verslag wordt door de heer Doornbosch opgemerkt dat in de offerte van de fa. Teeninga betreffende het "stuka-doorwerk" niets is opgenomen voor het verfwerk; dit moet nog bij de raming op.
3. De voortgang van de restauratie wordt besproken. Maandag 1 september 1986 is de fa. Doornbosch weer begonnen met de restauratie. Door de Europese Gemeenschap te Brussel is aan de provincie Groningen t.b.v. het behoud van vakbekwaamheid in de molenbouw een subsidie beschikbaar gesteld van f 200.000,--. Een van de voorwaarden hierbij is, dat het bedrag vóór 31 december 1986 verwerkt moet zijn. De fa. Doornbosch is één van de twee bedrijven die hiervoor is aangezocht. Het gevolg is, dat de verdere afwerking van de restauratie van de molen te Wetsinge naar 1987 wordt verschoven. De heer Doornbosch zegt toe het werk aan de stijlen verder af te zullen maken en de molen verder storm- en waterdicht te maken. Met één en ander is plm. 3 week gemoeid. De vergadering kan zich hierin vinden. Gezien wordt nog op de einddatum van de restauratie, n.l. 1 augustus 1987.
4. De volgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 24 september 1986 aanvang 16.00 uur bij de molen te Wetsinge.

*Onderwerp van bouwvergadering Beeld Cedar
 Volgende verg. bij aanvang werken
 Cedar in het voorjaar 1987.*



GEMEENTE

ADORP

<p>Verslag van 7e bouwvergadering t.g.v. de restauratie van de molen te Wetsinge dd. 24 september 1986, 16.00 uur in het gemeentehuis te Sauwerd.</p> <p>Aanwezig : de heren K. Doornbosch, S. Pasveer, J. Heydra, D. Kruijer en J.H. Koop.</p> <p>Afwezig: de heren A. Doornbosch en E. Offeringa</p>	
Onderwerp:	Aktie door :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Het verslag van de 6e bouwvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. De achtkant zal niet worden uitgevoerd in z.g. "potdekselwerk" maar in Hieraan zijn geen meerkosten verbonden. 3. T.a.v. de voortgang wordt gesteld dat over + 5 week de werkzaamheden voor dit jaar gereed zijn. De heer Doornbosch zegt toe er voor zorg te dragen dat de molen vóór de winter regen- en stormdicht zal zijn. Hiermee wordt ingestemd. Na de winter, vermoedelijk begin april 1987, zullen de werkzaamheden weer worden opgestart. 4. Gelet op de werkzaamheden wordt besloten geen nieuwe vergaderdatum vast te leggen. 	
